



## Acta de Entrega - Recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

Se constituye la presente para dar por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes, en el contrato citado líneas abajo, lo anterior conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En la Dirección de Obras Públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 12 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio acordado; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega - recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de inversión:	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES ✓
Ejercicio fiscal:	2025 ✓
Nombre de la Obra:	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS PALMITAS, EN LA CALLE GUANAJUATO Y PRIVADA GUANAJUATO."
Localidad:	LAS PALMITAS ✓

Secretar

**Datos Generales de la contratista:**

Contratista o empresa:	SALVADOR CORONA JIMENEZ ✓
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
N/A	GTO-SOP/PUC-0489-2012

**Datos del contrato:**

Número de contrato:	MDM/OP/07/SENCO-GTO-FISE-13/2025-AD-06 ✓		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/SEP./2025 ✓	22/DICIEMBRE/2025 ✓	22/SEP./2025 ✓	22/DICIEMBRE/2025 ✓
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión	
	N/A	N/A	

[Handwritten signature]

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



**NUEVO COMIENZO**

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

**Inversión contratada:**

<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Municipal</b>	<b>Otros</b>
412,810.87	206,405.44	0.00	206,405.43	0.00

**Inversión ejercida:**

<b>Total</b>	<b>Federal</b>	<b>Estatal</b>	<b>Municipal</b>	<b>Otros</b>
412,810.87	206,405.44	0.00	206,405.43	0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

Construcción de ampliación de red eléctrica, la cual se respalda con un transformador monofásico de 15 kva, seis postes de concreto de 12 m. de longitud, equipados con lo desarrollado en proyecto

Estos conceptos y acciones, fueron realizados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias que se presentaron en el proceso de ejecución.

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>4262-03802-1</b>	Valor de la fianza:	<b>41,281.09</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
<b>22 de diciembre de 2025</b>		Inicio	Término
		<b>12 de febrero 2026</b>	<b>12 de febrero 2027</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.</b>		
Ante:	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
Otras garantías:	<b>N/A</b>		

*See*

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	22/Septiembre/2025	21/Octubre/2025	\$ 329,973.22
2 (DOS)	NORMAL	22/Octubre/2025	20/Noviembre/2025	\$ 29,675.75
3 (TRES)	FINIQUITO	21/Noviembre/2025	22/Diciembre/2025	\$ 53,161.90
Importe total estimado:				<b>\$ 412,810.87</b>

*Sum*

**Observaciones:**


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social "

La Dirección de Obras Publicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.




**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Finiquito de obra	Relación de conceptos y volúmenes de obra ejecutados, así como el importe generado.
Fianza de vicios ocultos	Documento que avala, la calidad de los trabajos realizados, hasta por un año

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los habitantes y beneficiarios de la localidad Las Palmitas, representada en este acto por el **C. Mario Alvarado Flores**, en su carácter de Delegado Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.



**Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción**


<p><b>Por el municipio o entidad contratante.</b></p>  <p><b>TSU. Edgar Javier Reséndiz Jacobo</b></p> <p>Presidente Municipal</p>	<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p>  <p><b>Ing. Sara Jiménez García</b></p> <p>Directora de Obras Públicas</p>
<p><b>Por la supervisión / superintendente de obra.</b></p>  <p><b>S.O. Luis Alfredo Rodríguez Luna</b> Supervisor de Obras</p>	<p><b>Por los beneficiarios</b></p> <p><b>C. Mario Alvarado Flores</b> Delegado Municipal</p>

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



**NUEVO COMIENZO**  
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p></p> <p>_____ <b>Ing. Salvador Corona Jiménez</b> Representante</p>	<p>Por la Contraloría Municipal</p> <p></p> <p>_____ <b>Lic. Everardo Cárdenas Jiménez</b></p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>_____ Nombre: Cargo:</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>_____ Nombre: Cargo:</p>

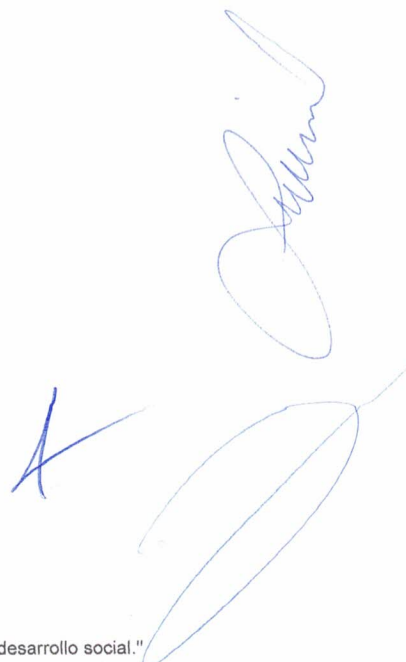

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."
