

Acta de entrega - recepción

Municipio: Doctor Mora, Gto.

En la dirección de obras públicas, del municipio de Doctor Mora, Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 03 de diciembre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FAIS MUN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	"BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA, GTO."
Localidad:	DOCTOR MORA

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	JUAN MANUEL HERNANDEZ QUINTERO
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
----	GTO-SOP/PUC-5117-2021

Datos del contrato:

Número de contrato:	MDM/OP/03/FAISMUN/2025-AD-01		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
02 DE AGOSTO DE 2025	02 DE NOVIEMBRE DE 2025	02 DE AGOSTO DE 2025	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
07 DE NOVIEMBRE DE 2025	Número de oficio	Fecha de emisión	
	MDM/OP/03/FAISMUN/2025-AD-01-MODIF-01	31 DE OCTUBRE DE 2025	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$627,147.62	---	---	\$627,147.62	---

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$821,715.76	---	---	\$821,715.76	---




A. I. G. S.

Descripción de los trabajos realizados:

Bacheo superficial y profundo en calles a bases de:

- 115.91814 m3 de bache
- 888.66 m2 de limpieza general

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3056590	Valor de la fianza:	\$82,171.57
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
31 DE OCTUBRE DE 2025	Inicio	Término	
	03 DE DICIEMBRE DE 2025	03 DE DICIEMBRE DE 2026	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX		
Ante :	LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.		
Otras garantías:			


Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	02 DE AGOSTO DE 2025	31 DE AGOSTO DE 2025	\$120,032.73
2 (DOS)	NORMAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$370,253.42
3 (TRES)	NORMAL	01 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$129,388.94
4 (CUATRO)	FINIQUITO	31 DE OCTUBRE DE 2025	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$202,040.67
Importe total estimado:				\$ 821,715.76

Observaciones:

La Dirección de Obras Publicas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

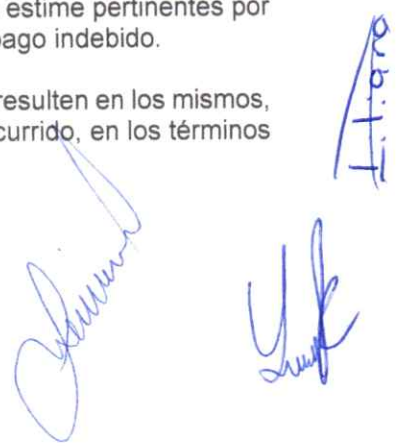

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Finiquito de obra	
Fianza de vicios ocultos	
Relación de estimaciones	

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de Oficialía Mayor.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p>  <p>Firma: _____ Nombre: T.S.U. Edgar Javier Reséndiz Jacobo Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p>  <p>Firma: _____ Nombre: Arq. María Yanet Terán Rodríguez Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p>  <p>Firma: _____ Nombre: Lic. Sara Jiménez García Cargo: Directora de Obras Públicas</p>	
<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p>  <p>Firma: _____ Nombre: Arq. Juan Manuel Hernández Quintero Cargo: Contratista</p>	
<p>Por la Contraloría Municipal:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: Lic. Everardo Cárdenas Jiménez Cargo: Contralor municipal</p>	<p>Por los beneficiarios:</p>  <p>Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____</p>
